

Styremøte Helse Møre og Romsdal

Ålesund 27.01.2016

Prosjektleder: Pål Ingdal

Prosjektdirektør: Bjørn Remen

Agenda

1. Milepæler konseptfasen
2. Dimensjonering hovedfunksjonsprogram
3. DMS Kristiansund
4. Mulighetsstudie
5. Medvirkning / samarbeid
6. utfordringer i prosjektet
7. Plan for forprosjektfasen

Milepæler konseptfasen

- Hovedfunksjonsprogram til prosjektstyret 16. februar
- Delfunksjonsprogram og skisseprosjekt i perioden februar til april
- Konseptrapport klar til sommeren
- Prosjektstyret august
- Høring september/oktober
- HMR og HMN desember 2016

Dimensjonering SNR

Hovedfunksjonsprogram

Kapasitetsanalyser og arealbehov - metode

Klinisk aktivitet

- Aktivitet 2014
- Befolkningsframskriving til 2030 - SSB
- Omstillingsfaktorer
- Utnyttelsesgrader
- Arealstandarder

Øvrige funksjoner

- Estimering av behov
- Sammenligning mot andre prosjekter

Endrings- og omstillingsfaktorer

For døgnopphold og liggedager

- Epidemiologi og medisinsk utvikling
- Overføring til:
 - kommune
 - pasienthotell
 - dag/poliklinisk behandling
 - observasjonsenhet
- Intern effektivisering

For poliklinikk og dagbehandling

- Epidemiologi og medisinsk utvikling
- Overføring til kommune


Utnyttelsesgrader

Undersøkelles- og behandlingsfunksjoner	Dager per år	Timer per dag	Minutter per undersøkelse/ behandling
Dagplass	230	8	240
Poliklinikk somatikk, gjennomsnitt alle fag	230	8	40
Poliklinikk psykiatri	230	8	75
Bildediasnosikk			
- Røntgen	230	10	15
- Ultralyd	230	8	25
- CT	230	8	25
- MR	230	10	30
Operasjon			
- Kirurgi	230	8	120
- Tann/kjeve	230	8	90
- Gyn/obst	230	8	80
- ØNH	230	8	120
- Øye	230	8	60
- Dagkirurgi	230	8	90
Belegg senger i prosent			
- Normalseng	85 %		
- Observasjonssenger	75 %		
- Pasienthotell	75 %		

Areal og bygningsmessige krav 2030

Hovedfunksjon	Delfunksjon	Romnavn kapasitets bærende rom	Kapasitets behov	Areal standard	Totalt netto areal	b/n faktor	Totalt brutto areal
Opphold, somatikk	Normalsengeområde	Sengerom	170	27	4577	2	9155
Opphold, somatikk	Intensiv	Overvåkingsplass	8	40	320	2	640
Opphold, somatikk	Tung overvåking	Overvåkingsplass		40	0	2	0
Opphold, somatikk	Pasienthotell	Sengerom	23	25	566	2	1132
Opphold, somatikk	Observasjon	Observasjonsplass	14	24	329	2	659
Opphold, somatikk	Dagområde	Dagplass	30	15	452	2	905
Undersøkelse og behandling, somatikk	Operasjon	Operasjon	11	110	1210	2	2420
Undersøkelse og behandling, somatikk	Oppvåkning	Overvåkingsplass	17	16	264	2	528
Undersøkelse og behandling, somatikk	Radiologi	Undersøkelse	16	71	1140	2	2280
Undersøkelse og behandling, somatikk	Poliklinikk	Undersøkelse	73	30	2185	2	4370
Undersøkelse og behandling, somatikk	Kliniske spesiallaboratorier	Undersøkelse	32	30	960	2	1920
Undersøkelse og behandling, somatikk	Kliniske spesiallaboratorier	Fødestuer	3	70	210	2	420
Psykiatri	Poliklinikk		7	15	105	2	210
Psykiatri	Normalsengeområde		39	30	1170	2	2340
Psykiatri	Sengeområde skjerming		8	50	400	2	800
	Delsum				13889		27778
Administrasjon	Sentral administrativ kontorfunksjon			0	0	2	0
Administrasjon	Merkantile kontorfunksjoner			0	0	2	0
Administrasjon	Kliniske kontorfunksjoner		1	3523	3523	2	7046
Undersøkelse og behandling, somatikk	Ambulansetjeneste				0	2	0
Undersøkelse og behandling, somatikk	Akuttmottak		1	500	500	2	1000
Undersøkelse og behandling, somatikk	Legevakt				0	2	0
Undersøkelse og behandling, somatikk	Kliniske støttfunksjoner		1	75	75	2	150
Undersøkelse og behandling, somatikk	Fysio/Ergoterapi		1	305	305	2	610
Pasientservice	Pasientservice, LMS		1	250	250	2	500
Medisinsk service	AMK-sentral				0	2	0
Medisinsk service	Laboratorier		1	1920	1920	2	3840
Medisinsk service	Apotek		1	525	525	2	1050
Ikke-medisinsk service	Sterilsentral		1	300	300	2	600
Ikke-medisinsk service	Ikke medisinsk service		1	2858	2858	2	5716
Personalservice	Personalservice		1	1700	1700	2	3400
Undervisning og forskning	Undervisning og forskning		1	940	940	2	1880
	Delsum			12896	12896		25792
	Totalt				26785	2	53570

Et godt poliklinisk tilbud/DMS Kristiansund

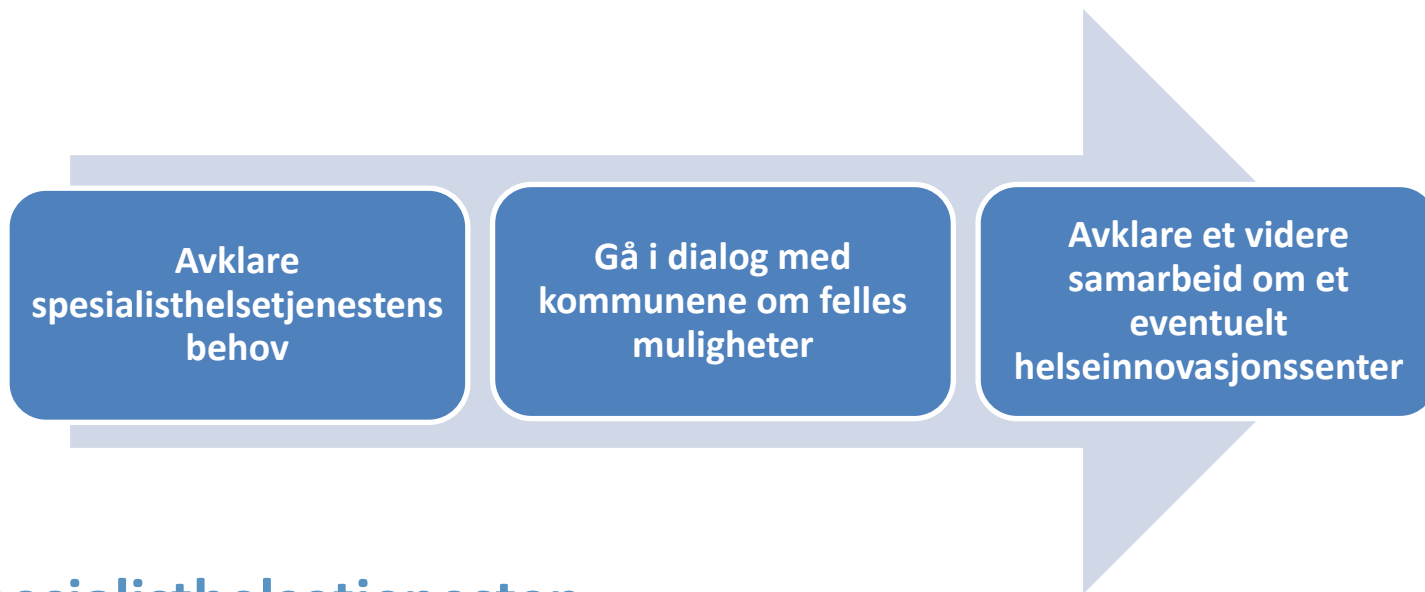


Spesialisthelsetjenesten


- En lineær fremstilling av 8 mulige alternativer fra absolutt minimum til et stort tilbud ble presentert for hovedgruppa i første møte
- Neste møte ble det presentert 4 alternativer som nå er redusert til 2 alternativer
- Legges frem for prosjektstyret i februar
 - Deretter brynes disse mot bygningsmessige muligheter på to lokasjoner
 - Og i videre dialog med kommunene

Utvalgs- og evalueringskriterier, steg 1


- Nærhet til pasientgrupper som trenger oss hyppig, og der reisevei og fravær fra hjem/liv er belastende (behov for tilgjengelighet, nærhet og koordinerte tjenester, for eksempel eldre og de med kroniske lidelser)
- Kvaliteten like god begge steder i SNR på det som gjøres begge steder
- Robust driftskonsept; drivverdig i langt perspektiv, ikke enkeltpersonavhengig. Være forankret i solid klar HMR-strategi
- Velge modell/arbeidsdeling som understøtter fremtidsrettede og moderne driftsformer
- Volumvurdering på tilbudet, samt ambisjoner om fleksible driftsformer
- Støtte opp under felles fagmiljø og felles kultur i fagmiljøet (spesialister og eventuelt andre faggrupper jobbe begge steder)
- Investeringskostnader og driftskostnader
- Tilbud skal ikke utløse dobbel vaktberedskap i SNR utover vedtatt åpningstid

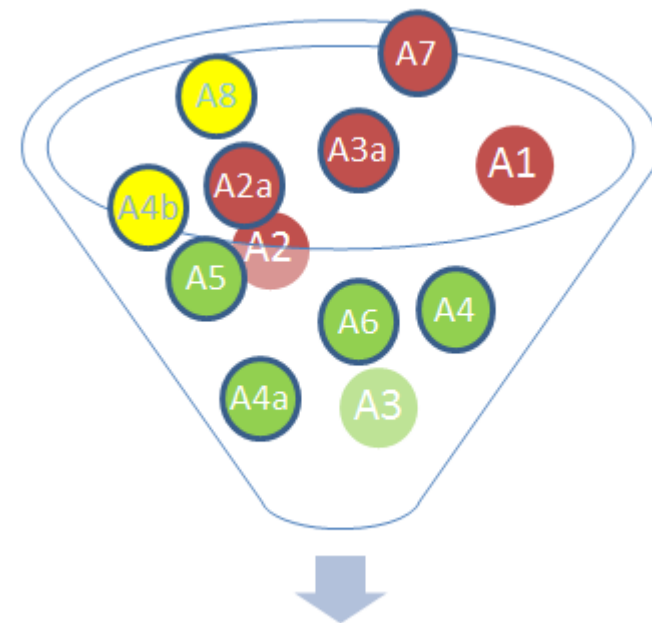

Konseptutvikling, steg 2

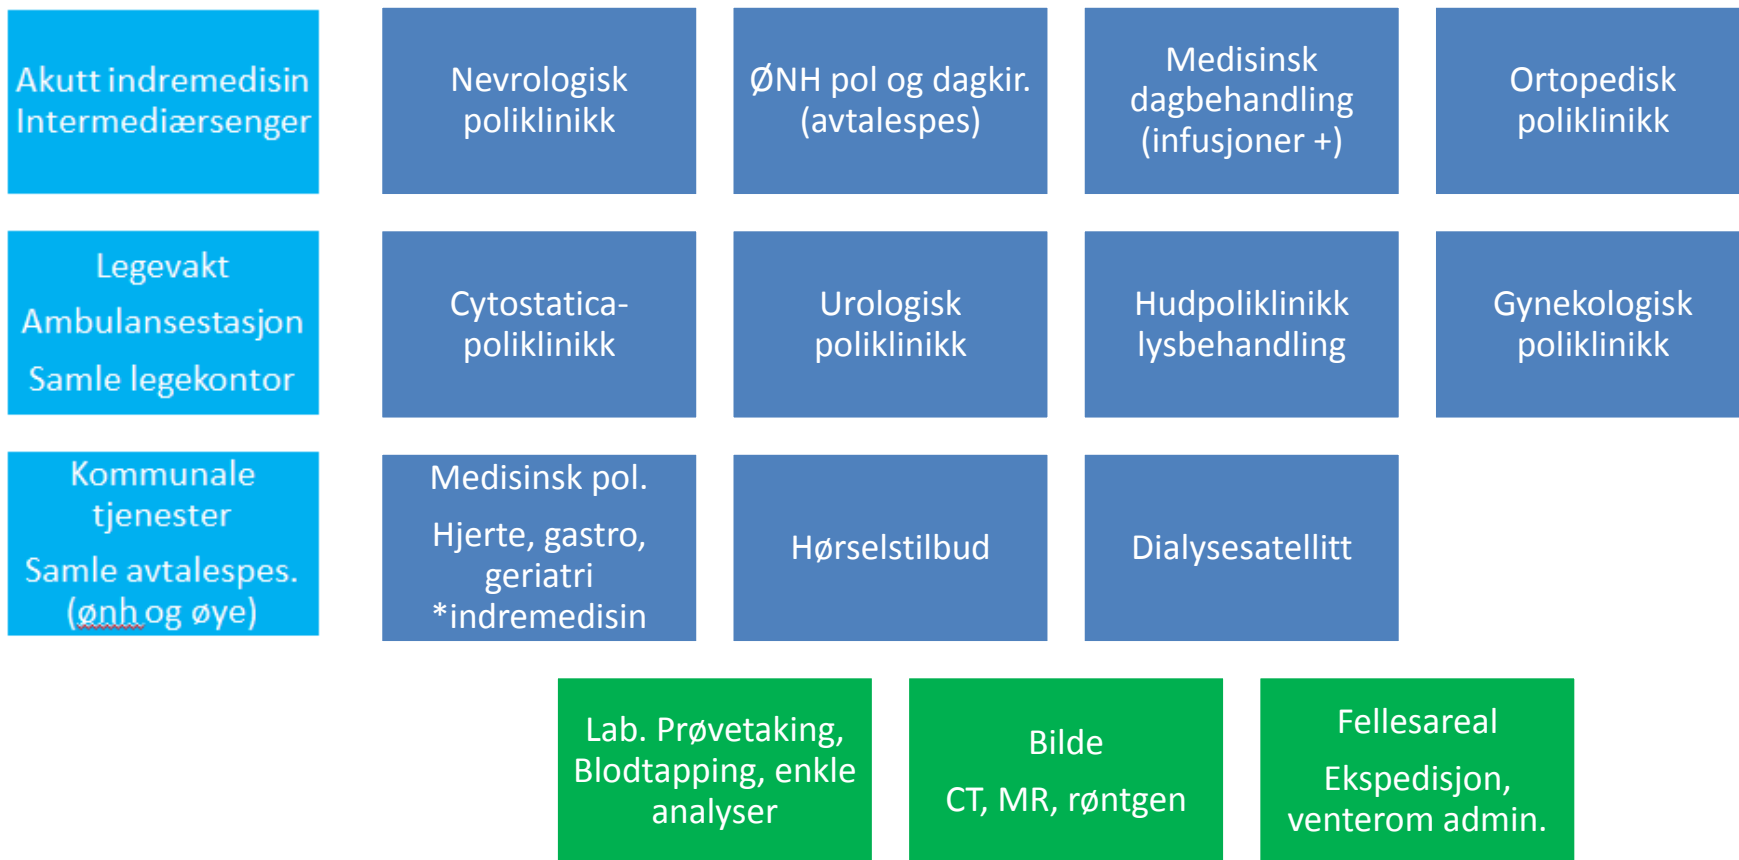


Konseptutvikling, steg 2






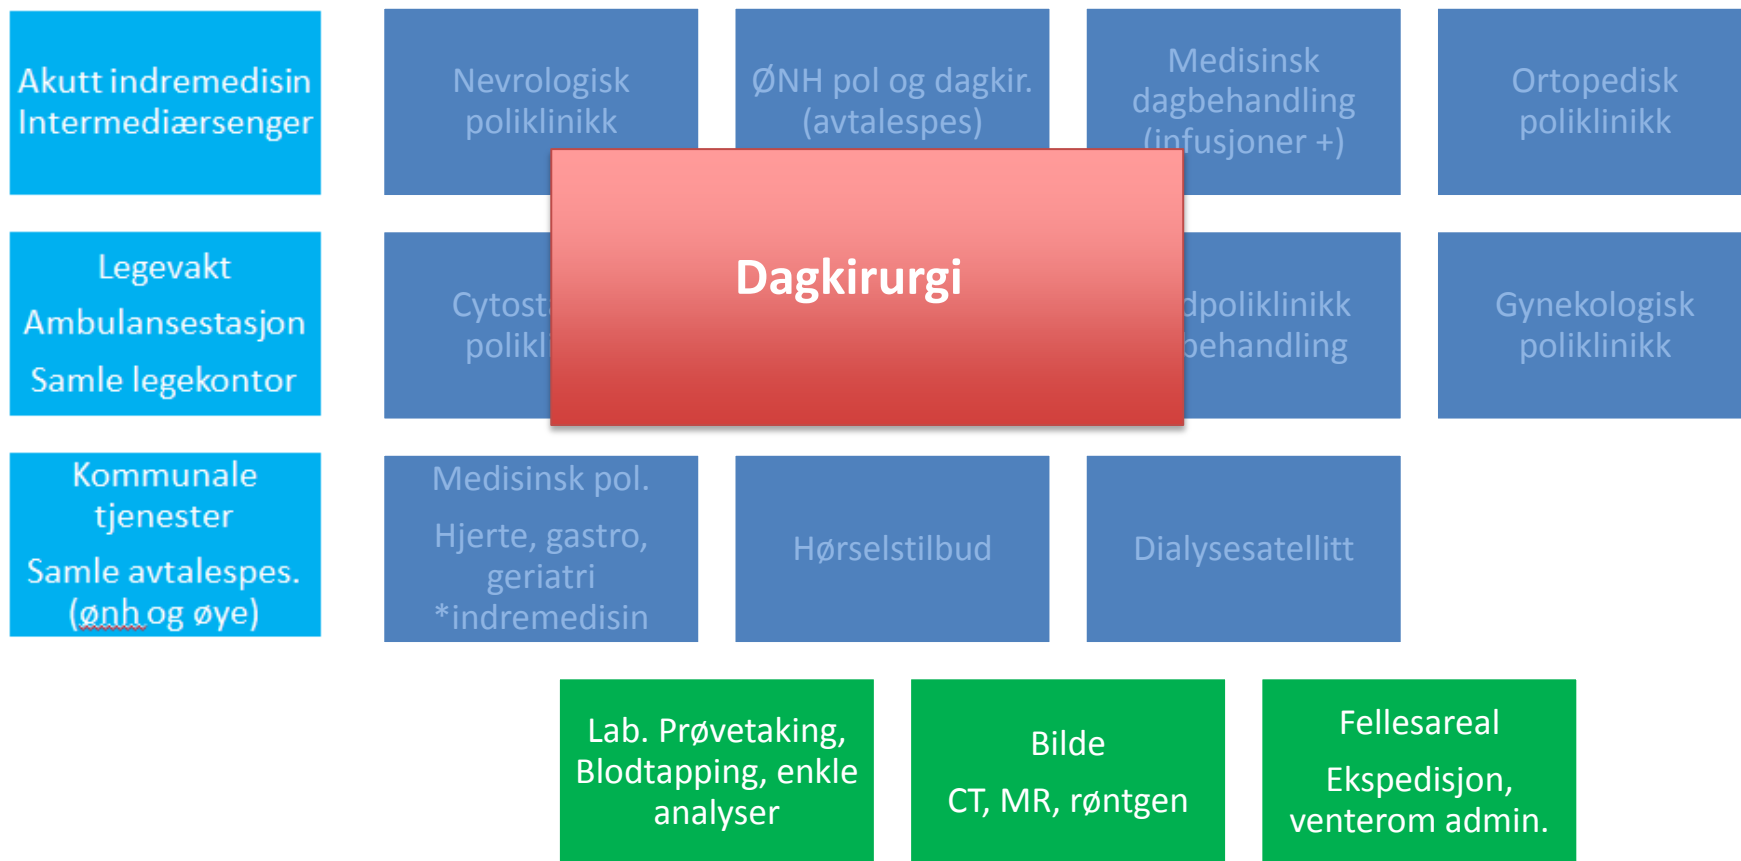


Mulighetsstudiet







Konvergerende prosess

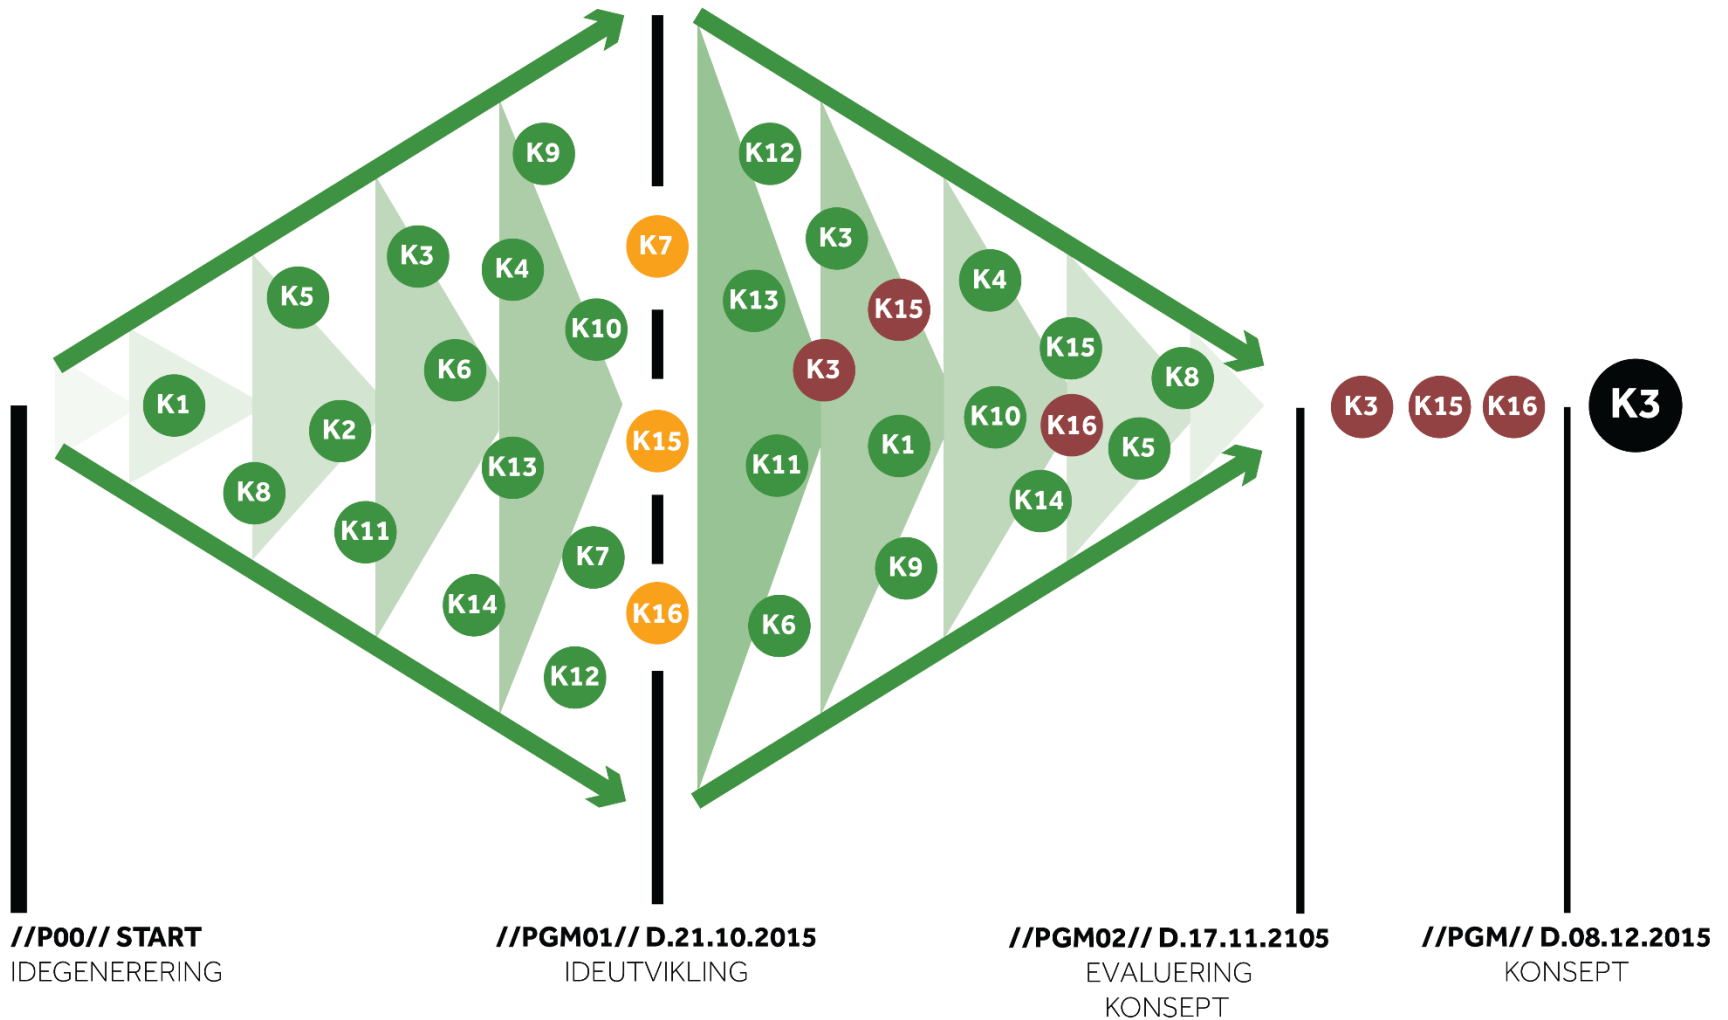

Konvergerende prosess

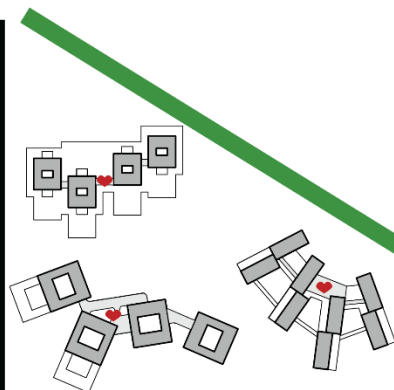

KONSEPTUTVIKLING
PROGRAMANALYSE




//PGM03// D.17.11.2015
FEM KONSEPTER

//PGM03// D.08.12.2015
SYNTSE TRE KONSEPTER/EVALUERING

HUS V3

D.15.12.2015
ETT KONSEPT

FUGLEPERSPEKTIV

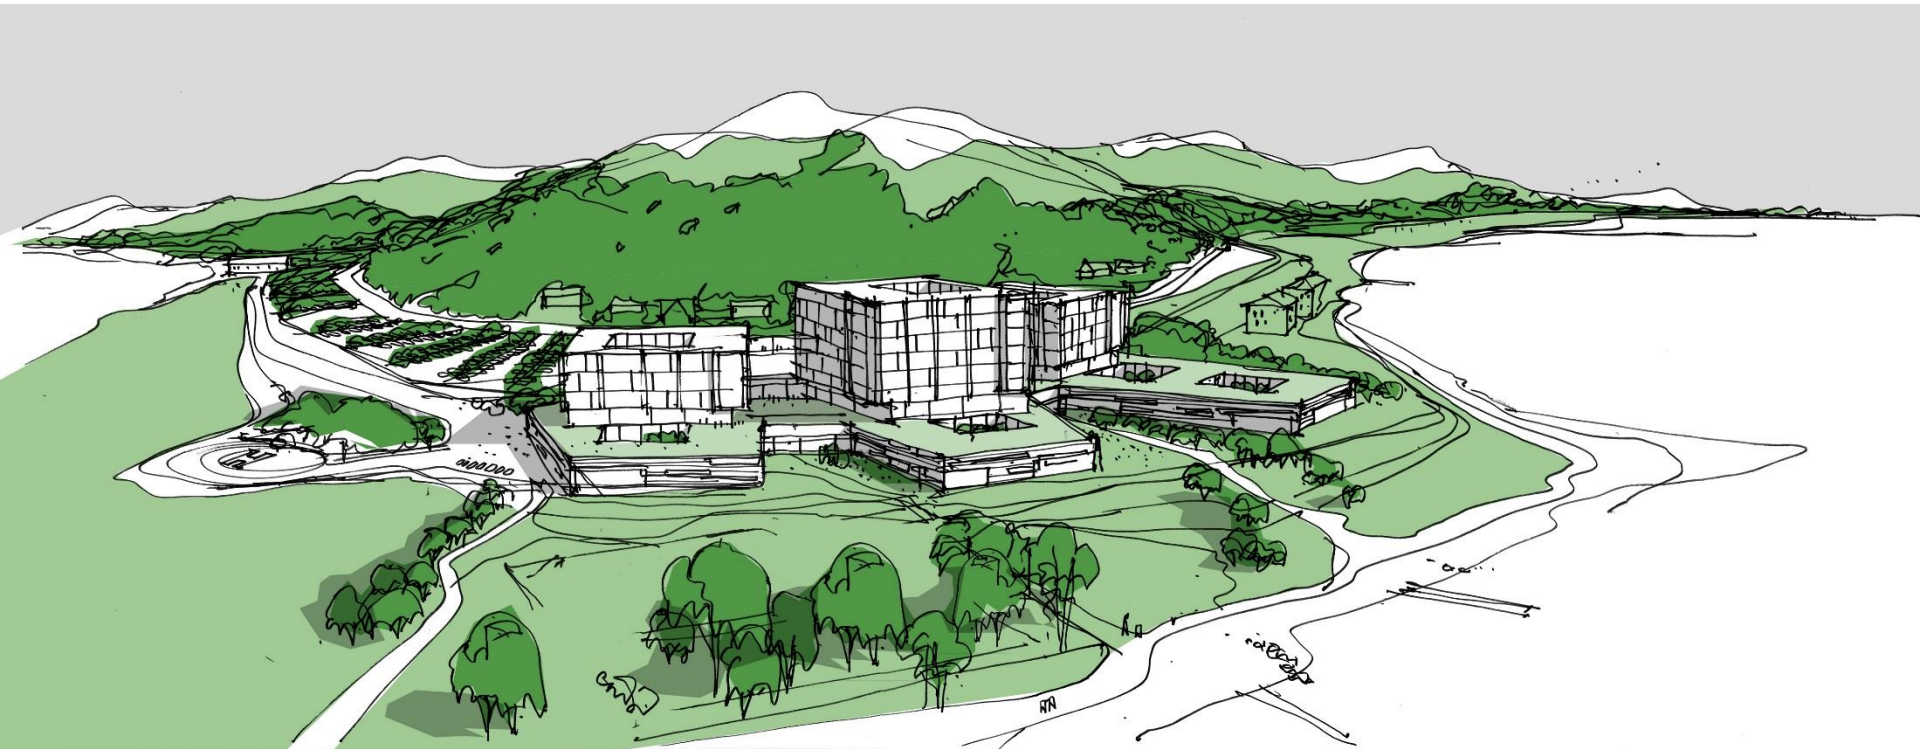

Medvirkning / samarbeid

- 28. januar - møte med ansatte på Hjelset
- 2. februar - kick-off. i Molde. Alle medvirkningsgrupper deltar
- 3. februar - møte med kommunene i Angvika
- Samarbeid og infomøter med ulike næringsforum
- Kontaktmøter regulering Hjelset. Molde kommune / Møre og Romsdal fylkeskommune

Utfordringer i prosjektet

1. Beslutninger og signaler vedr. overordnede / konseptuelle valg:

- Kjøkken / matproduksjon
- Avklare funksjonsdelinger (ortopedi, barn, ØNH, tann/kjeve)
- Ambulanse / prehospitale tjenester

Utfordringer i prosjektet

2. DMS i Kristiansund

- Avgjørende å få tilstrekkelig dialog og avklaringer vedr. videre bruk av bygningsmassen ved Kristiansund sykehus.



Utfordringer i prosjektet

3. Bæreevne/økonomi:

- Foretakets og prosjektets bæreevne
- Videre bruk og eller avhending av sykehusbygg og arealer i Molde og Kristiansund

Plan for forprosjektfasen

- **Utarbeides til mai 2016**
 - Inkl. gjennomføringsstrategi
 - Organisering / ressursbruk
 - Budsjett
 - Framdriftsplan



SYKEHUSBYGG

sjukehusbygg.no

